Torslundevej

Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1					
2		Torslundevej Etape 1			
3					
4		Byggepladsindretning	10 dage	ma 07-11-16	fr 18-11-16
5		Vandledning	27 dage	ti 15-11-16	on 21-12-16
6		Styret underboring Smedeengen	3 dage	on 14-12-16	fr 16-12-16
7		Cracking af ledning SL99050 - SL24002	5 dage	ma 12-12-16	fr 16-12-16
8		Regnvandsledning hovedledning	22 dage	ma 09-01-17	on 08-02-17
9		Vejbrænde	22 dage	ma 16-01-17	ti 14-02-17
10		Arbejder ved gasledning	22 dage	ma 16-01-17	ti 14-02-17
11		Vejkasse kloakgrav	22 dage	to 19-01-17	ma 20-02-17
12		Udgravning fællessti nordside	3 dage	on 01-02-17	fr 03-02-17
13		Udlægning BSG nordside	3 dage	ma 06-02-17	on 08-02-17
14		Udlægning MSG nordside	3 dage	to 09-02-17	ma 13-02-17
15		Vandrende nordside	4 dage	ti 14-02-17	fr 17-02-17
16		Asfalt nordside	3 dage	ma 20-02-17	on 22-02-17
17					
18		Torslundevej Etape 2			
19					
20		Regnvandsledning hovedledning	17 dage	to 09-02-17	fr 03-03-17
21		Vejbrænde	17 dage	to 16-02-17	fr 10-03-17
22		Vejkasse kloakgrav	22 dage	to 09-02-17	fr 10-03-17
23		Udgravning fællessti nordside	3 dage	fr 03-03-17	ti 07-03-17
24		Udlægning BSG nordside	3 dage	on 08-03-17	fr 10-03-17
25		Udlægning MSG nordside	3 dage	ma 13-03-17	on 15-03-17
26		Vandrende nordside	4 dage	to 16-03-17	ti 21-03-17
27		Asfalt nordside	3 dage	on 22-03-17	fr 24-03-17
28					
29		Torslundevej Etape 3			
30					
31		Udgravning fællessti	3 dage	on 15-03-17	fr 17-03-17
32		Udlægning BSG	3 dage	fr 17-03-17	ti 21-03-17
33		Udlægning MSG	3 dage	on 22-03-17	fr 24-03-17
34		Vandrende	4 dage	ti 28-03-17	fr 31-03-17
35		Asfaltering	2 dage	to 30-03-17	fr 31-03-17
36					
37		Torslundevej Etape 4			
38					
39		Udgravning fællessti	3 dage	ti 28-03-17	to 30-03-17
40		Udlægning BSG	3 dage	fr 31-03-17	ti 04-04-17
41		Udlægning MSG	4 dage	ti 04-04-17	fr 07-04-17
42		Vandrende	4 dage	ma 10-04-17	to 13-04-17
43		Asfaltering	2 dage	fr 14-04-17	ma 17-04-17
44					
45					
46		Finish, aptering, bump mv.	31 dage	ti 18-04-17	ti 30-05-17

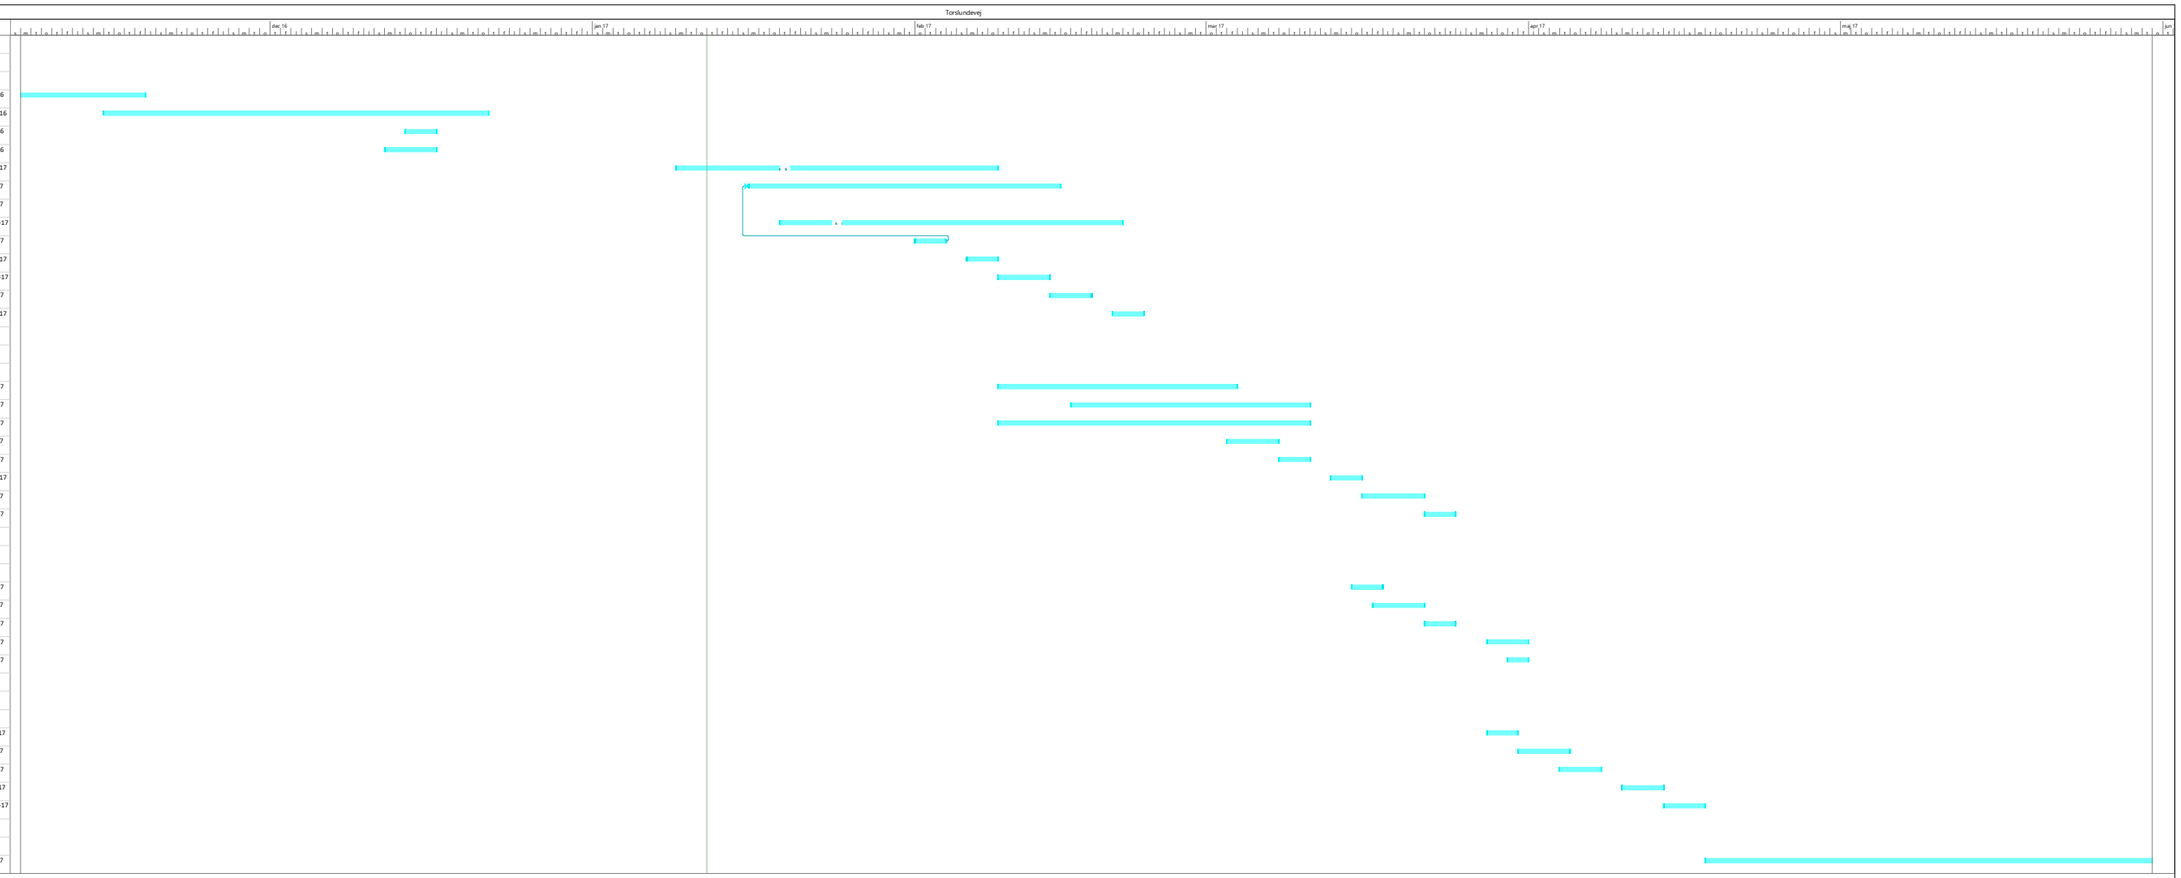

Projekt: Projekt1
Dato: to 12-01-17

Opgave | Opdeling | Milepæl | Hovedopgave | Projektoversigt | Inaktiv opgave | Inaktiv milepæl | Inaktiv oversigt | Manuel opgave | Kun varighed | Manuel oversigtsopfølgning | Manuel oversigt | Kun start | Kun slutdato | Eksterne opgaver | Ekstern milepæl | Deadline | Fremdrift | Manuel status
