Torslundevej
Ishøj Kommune

GORM HANSEN & SØN A/S
Entreprenører
Øde Hastrupvej 12
4000 Roskilde

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	**Ledningsarbejder**	**89 dage**	**ti 10-01-17**	**fr 12-05-17**
2	Regnvandsledning BR SL35266 - BR SL35284 incl vejkasse	37 dage	ti 10-01-17	on 01-03-17
3	Regnvandsledning BR SL35288 - BR SL35286 incl vejkasse	5 dage	to 02-03-17	on 08-03-17
4	Regnvandsledning BR SL35288 - BR SL35398 incl vejkasse	16 dage	to 09-03-17	to 30-03-17
5	Regnvandsledning BR SL35199 - BR SL35197 incl vejkasse	5 dage	fr 31-03-17	to 06-04-17
6	Vejbrønde	75 dage	ma 30-01-17	fr 12-05-17
7	Gasomlægning ved Vejbrønde	75 dage	ma 30-01-17	fr 12-05-17
8	Asfaltering af ledninggrav	5 dage	ma 08-05-17	fr 12-05-17
9	**Belægningsarbejder**	**75 dage**	**ma 03-04-17**	**fr 14-07-17**
10	Etablering af fællesti i nordlige side, udgravning og grusbærelag	25 dage	ma 03-04-17	fr 05-05-17
11	Vandrende i nordlige side	19 dage	ti 18-04-17	fr 12-05-17
12	Asfalt nordlige side	5 dage	ma 08-05-17	fr 12-05-17
13	Etablering af fællesti i sydlige side, udgravning og grusbærelag	40 dage	ma 08-05-17	fr 30-06-17
14	Vandrende i sydlige side	40 dage	ma 15-05-17	fr 07-07-17
15	Asfalt sydlige side	5 dage	ma 03-07-17	fr 07-07-17
16	Hævet flader	5 dage	on 05-07-17	ti 11-07-17
17	Stribearbejder	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17
18	Retablering arbejder	10 dage	ma 03-07-17	fr 14-07-17
19	Afrigning af byggeplads	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17

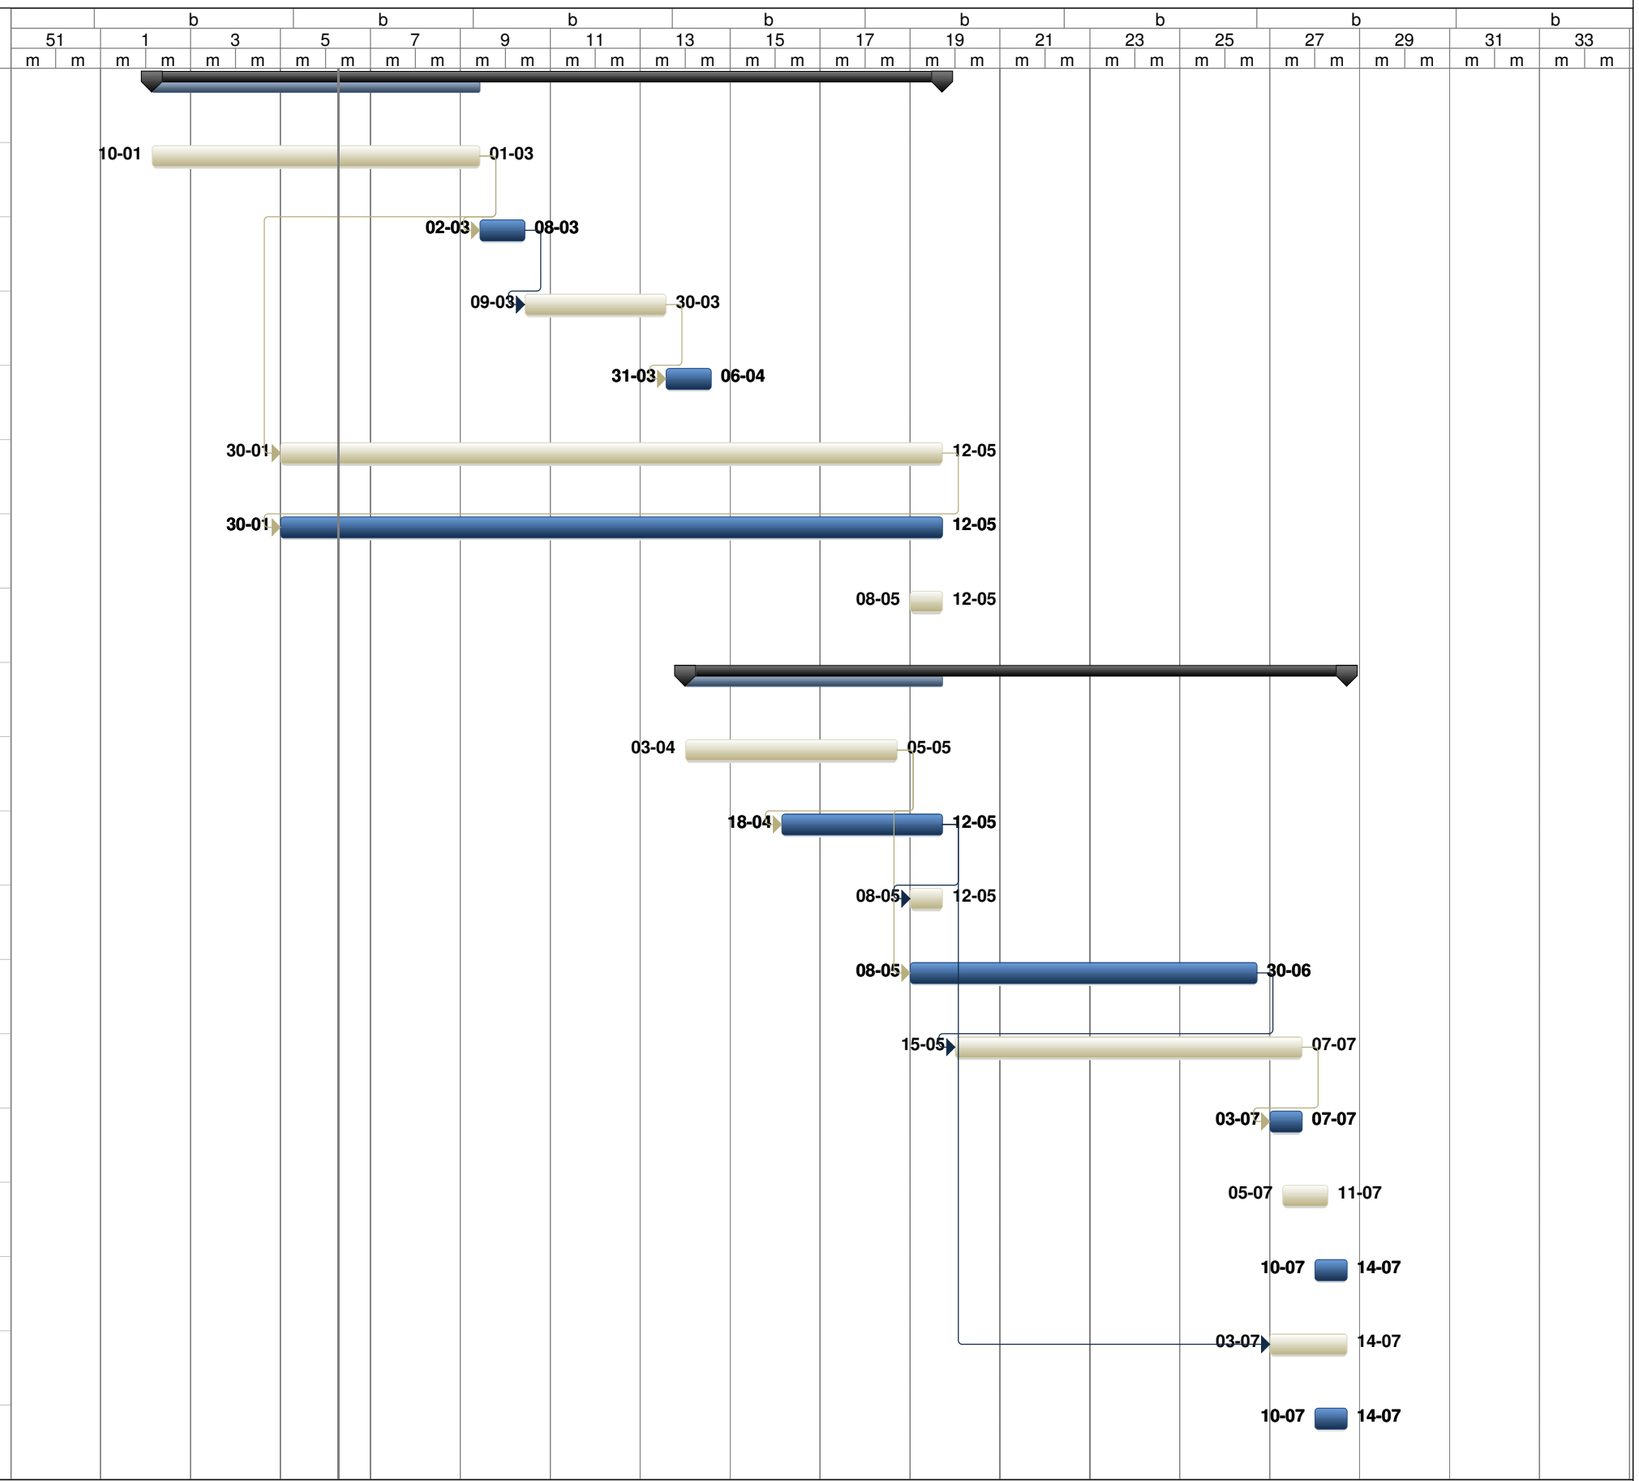

on 08-02-17 11:41

Jacob Nielsen
